



**REDE DE SALVAGUARDA DO  
TERRITÓRIO FLORESTAL**

Defesa da Floresta em geral e o  
Projeto EEAGrants em particular  
Por Paulo Castro, AFN

Os Planos Diretores Municipais de 2ª Geração  
e o Planeamento da DFCI  
CCDR-Centro Coimbra 30/11/2011



[v.afn.min-agricultura.pt](http://v.afn.min-agricultura.pt)


eea grants  Ministério da  
Agricultura 

**os antecedentes (1/2):**



- Fogos de 2003 e 2005 que devastaram o País;**
- Implementação do Plano Nacional DFCI;**
- Instalação das Comissões Municipais DFCI;**
- Aprovação dos PROF em todo o País;**
- Elaboração dos Planos Municipais de DFCI.**



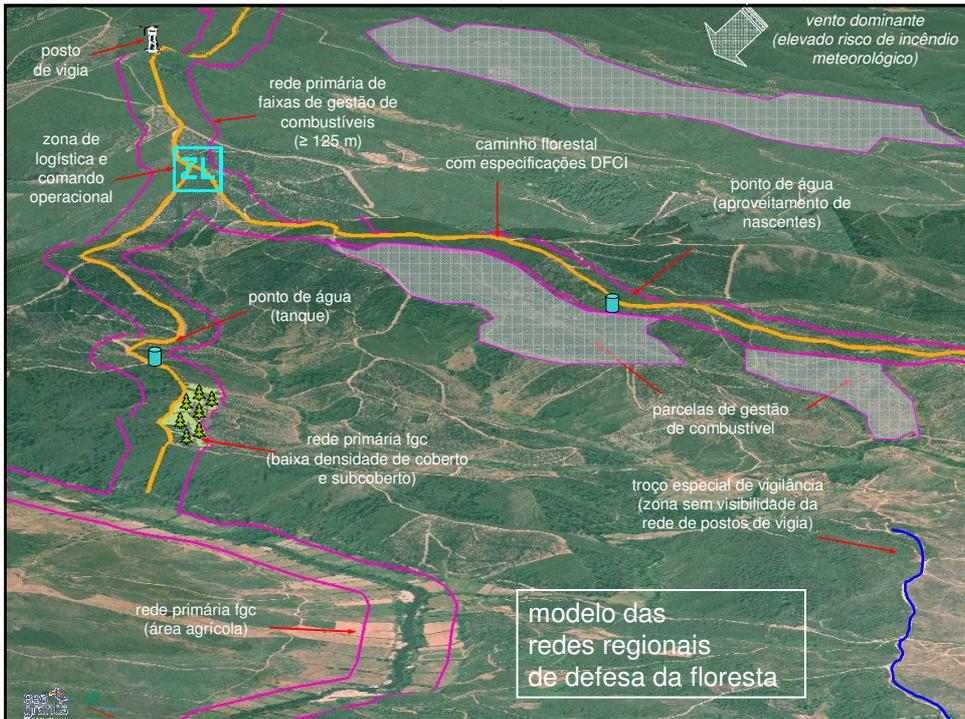

## rede primária de faixas de gestão de combustível



perímetro florestal de manteigas, 2007

## os antecedentes (2/2):




**Havia uma necessidade de actuação urgente;**

**Havia uma base técnica conceptual;**

**Havia uma base legal;**

**Havia uma prática instalada de escala local e dispersa;**

**Faltava escala para efeitos de demonstração prática.**

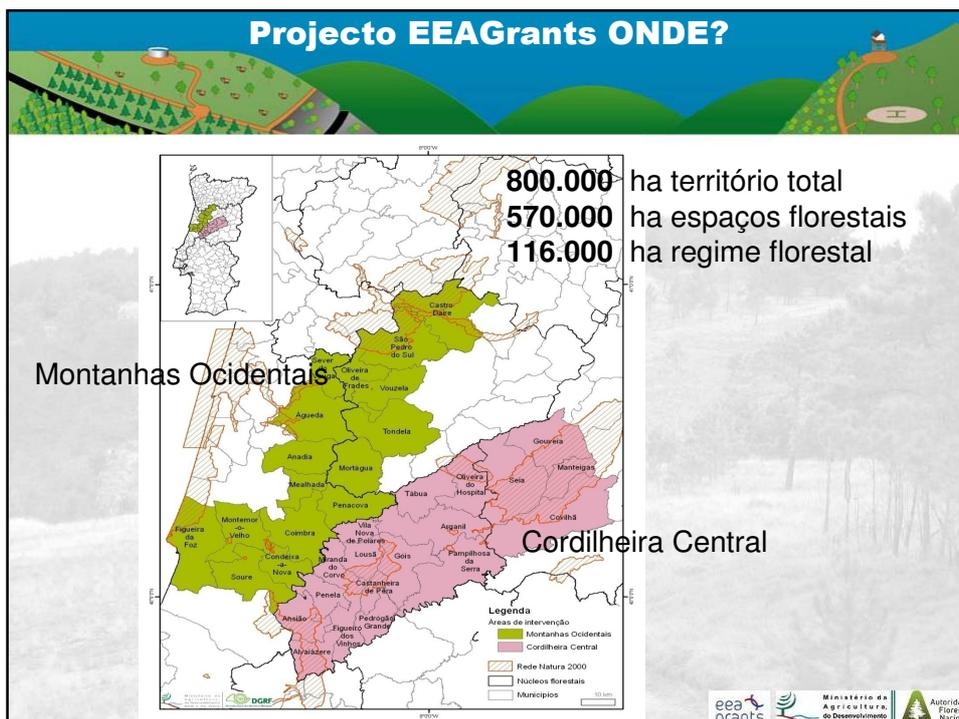

- ### Projecto EEAGrants FAZER O QUÊ?
1. PLANEAR
  2. EXECUTAR
  3. FORMAR
  4. DIVULGAR
- 
- eea grants  
 Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural  
 Autoridade Florestal Nacional

## Grandes Objectivos do Projecto :

1. **PLANEAR** a Rede Primária na área do Projecto (34 concelhos da Região Centro);
2. **EXECUTAR** a Rede Primária em 4 Núcleos de demonstração: Figueira da Foz, Manteigas, Pampilhosa da Serra e Vouzela (1.560 ha propostos);
3. **FORMAR** os parceiros do projecto (90 formandos);
4. **DIVULGAR** acções na Região e para o País através do Centro de Interpretação em DFCL da Casa da Vela na Serra da Boa Viagem, dos Núcleos de Demonstração e de outras acções.

## Actividade I - Planeamento:

1. **PLANEAR** a Rede Primária na área do Projecto (34 concelhos da Região Centro);
2. **Alterações:** Jan2009 publica DL nº17/2009 prevê nível distrital de DFCL competência exclusiva RPFGC;
3. **Consequências:** abandonar planeamento municipal e passar a distrital que entretanto foi “suspenso”;
4. **Resultados:** RPFGC aprovada nos concelhos onde foi executada e apoio ao planeamento distrital que se esperava fosse aprovado em 2011 nos 6 distritos da área do Projecto=101 concelhos, mas ...

## Actividade II - Execução:

1. **EXECUTAR** a Rede Primária em 4 Núcleos de demonstração: Figueira da Foz, Manteigas, Pampilhosa da Serra e Vouzela (1.560 ha propostos);
2. **Alterações:** abandono execução FF Serra Boa Viagem (Mata Nacional) e faseamento dos contratos;
3. **Consequências** opção reforço (3+2) nos outros concelhos e ainda Seia e Gouveia;
4. **Resultados:** 25 contratos com 19 baldios e mais de 1.560 ha contratados prevendo-se cumprimento da meta e fechou-se Manteigas com RPFGC.

## Actividade III - Formação:

1. **FORMAR** os parceiros do projecto (90 formandos);
2. **Alterações:** novo nível planeamento distrital e atrasos/restrições nas autorizações de saídas ao estrangeiro;
3. **Consequências** reforço formação nível distrital e recurso base nacional de formadores;
4. **Resultados:** formaram-se 145 técnicos com 198 horas de formação.

## Actividade IV - Divulgação:

1. **DIVULGAR** acções na Região e País através do Centro de Interpretação em DFCI da Casa da Vela na Serra da Boa Viagem, dos Núcleos de Demonstração e outras acções;
2. **Alterações:** atrasos/restrições nas autorizações e pagamentos;
3. **Consequências** não entrada em funcionamento durante vigência do projecto da Casa da Vela e atrasos nas outras acções;
4. **Resultados:** produção DVD, instalação da Casa da Vela, folheto base, 3 janelas interpretativas, apresentações mais 1.000 pax/9 conferências, 35.000 pax/exposições feiras e mais de 25.000 leitores/2 publicações.

## Projecto EEAGrants PONTOS FORTES?

1. Fez-se RPFGC à escala da paisagem e temos um concelho fechado com RPFGC;
2. Os proprietários fizeram o trabalho e quebrou-se um mito;
3. A RPFGC foi entendida como vantagem pela restante comunidade;
4. Envolveu-se comunidade técnica na discussão de novo paradigma RPFGC.

## Projecto EEAGrants PONTOS FRACOS?

1. Atrasos financeiros na execução comprometeram dinâmica projecto;
2. Alterações substanciais da lei DFCI obrigaram a grandes inflexões/atrasos;
3. Mudanças do quadro institucional diminuíram impacto interno/externo.

## Projecto EEAGrants RECOMENDAÇÕES?

1. Esclarecimento entidade que propõe DUP;
2. Coordenação Distritos/AFN nos PDDFCI;
3. Definição prioridades nacionais/distritais;
4. Articulação interna MAMAOT/PRODER;
5. Uso PT0016 como Unidade Demonstração.



## REDE DE SALVAGUARDA DO TERRITÓRIO FLORESTAL

Muito obrigado!

Esperamos que este projecto possa dar os frutos  
para que foi pensado e executado!

[v.afn.min-agricultura.pt](http://v.afn.min-agricultura.pt)

eea



Ministério da  
Agricultura



2014-2020



2014-2020
